

Bogotá, D.C., 07 de abril de 2025



FFIE2025EE005946

Señores

JUZGADO PRIMERO (01) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA

RAMA JUDICIAL

j01pccmbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co

Buenaventura, Valle Del Cauca

Asunto: Cumplimiento a Sentencia T-547 DE 2023.

Cordial saludo;

Atendiendo lo ordenado por la **SALA NOVENA DE REVISIÓN DE TUTELAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**, conforme a lo resuelto en Sentencia Número T-547 del pasado 6 de diciembre de 2023, en el marco del proceso de revisión del fallo proferido el 11 de abril de 2023 por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, dentro del Expediente T-9.384.835, me permito con el reiterado respeto, presentar ante ud(s) el Informe Trimestral, respecto de aquellos asuntos que atañen al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), en nombre de la Nación- Ministerio de Educación Nacional (MEN). Se adjunta el informe.

Atentamente,

MAGDA YOLIMA AMAYA AREVALO

Directora

DIRECCIÓN JURÍDICA

Proyectó: JORGE MARIO PEREZ SOLANO

Revisó: JUAN CARLOS LAVERDE ALBA

Anexos: Informe Simón Bolívar Periodo marzo 2025.pdf

Informe Trimestral IE Simón Bolívar Sede Principal
Distrito Especial de Buenaventura
31 de marzo de 2025

En la Institución Educativa Simón Bolívar en su sede principal, el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE realiza una intervención que contempla la construcción de: 12 aulas nuevas de básica media, 1 comedor, 1 cocina, 1 zona recreativa, 21 baterías sanitarias y circulaciones. Adicional a la obra de ampliación, se realiza una intervención de mejoramiento integral a los tres bloques del colegio existente ejecutando las siguientes actividades:

1. Cambio de estructura y teja de cubierta
2. Construcción y/o reparación de muros, repellos, estuco y pintura
3. Reparación de humedades y filtraciones
4. Limpieza de canales
5. Reparación y/o cambio de tuberías hidrosanitarias
6. Reconstrucción baterías sanitarias
7. Reconstrucción instalaciones eléctricas
8. Mantenimiento y pintura de fachada.

Estas actividades se realizan a través del Contrato de obra 1380-1357-2020 a cargo del contratista Unión Temporal Corvez (cesión contratista Miroal S.A.S) y es supervisado por la interventoría Consorcio Cinco Opciona. Este contrato inició con la fase de estudios y diseños de la obra de ampliación, así como, la gestión de la licencia de construcción y sus permisos.

Posterior a ello, se continuo con la etapa de obra, que inicio el 13 de abril de 2023.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las condiciones del contrato desde su inicio a la fecha.

| Contrato de obra 1380-1357-2020. | |
|---|---|
| Objeto | i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción para la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE PRINCIPAL. |
| Valor inicial del contrato | \$ 6.087.090.951 |
| Fecha de suscripción contrato de obra | 14 de enero de 2021 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Plazo inicial del contrato | 14 meses |
| Fecha de inicio Fase 1 | 19 de febrero de 2021 |
| Fecha de Socialización Fase 1 | 02 de octubre de 2017 |
| Suspensión No .01 | 17 de junio de 2021 a 30 de julio de 2021. Coordinación de la socialización del diseño con la ETC Buenaventura, mesa del Paro Cívico y comunidad educativa |
| Suspensión No. 02 | 12 de agosto de 2021 a 11 de octubre de 2021. Solicitud de ajuste a la ETC del área de predio en documentos de titularidad. |
| Prórroga No 01 del plazo del contrato | 75 días calendario, Plazo necesario para incorporar al diseño las solicitudes de la comunidad y mesa de paro |
| Suspensión No. 03 | 24 de diciembre de 2021 a 24 de enero de 2021. Se suspende por los plazos para realizar los trámites de licencia de construcción en la curaduría |
| Suspensión No. 04 | 08 de abril de 2022 a 06 de junio de 2022 Trámites y respuesta de la empresa de servicios públicos SAAB conexiones acueducto y alcantarillado |
| Suspensión No. 05 | 14 de junio de 2022 a 22 de septiembre de 2022 solicitud de aprobación diseños eléctrico por el operador Celsia |
| Suspensión No. 06 | 11 de octubre de 2022 a 09 de enero de 2023. Solicitud permiso intervención espacio público en Planeación para continuar trámite en Celsia |
| Fecha Inicio Fase 2 Obra | 10 de abril 2023 |

| | |
|---------------------------|--|
| Prórroga No 01 | 6 meses 15 días. Plazo de acuerdo con cronograma de obra, ampliación a causa de afectación al proceso constructivo por situaciones encontradas en fase demolición, retiro de postes eléctricos, orden público, factores climáticos |
| Prórroga No 02 | 5 meses 19 días afectaciones por tubería oleoducto que restringe el avance obra entre 30 de junio de 2023 a 29 de noviembre de 2023. |
| Suspensión 7 | 26 de marzo de 2024 a 31 de marzo del 2024. – cancelación de suministro por parte de proveedores por festividades de semana Santa. |
| Suspensión 8 | 18 de noviembre de 2024 al 13 de enero de 2025. – orden público, protestas por falta de agua potable y desabastecimiento de materiales. |
| Suspensión 9 | 10 al 23 de febrero de 2025 por dificultades de orden de público. |
| Prórroga 03 y adición | Ampliación y adición de plazo por mayores cantidades de obra. |
| Prórroga 04 | Prórroga del plazo de ejecución |
| Prórroga 05 y adición | Ampliación y adición de plazo por ajuste diseño hidrosanitario y rediseño de la cimentación del cerramiento perimetral. |
| Prórroga 06 y adición | Ampliación y adición de plazo por mayores cantidades de obra. |
| Valor actual del contrato | \$11.819.193.312 |
| Terminación contractual | 04 de agosto de 2025 |

Actividades y avance obra ampliación

El contrato cuenta con una ejecutado del 54.97 % que corresponde a la obra de mejoramiento integral que ya fue ejecutada y el avance de las actividades en la obra de ampliación:

- i) Del mejoramiento integral se informa que se tuvieron las siguientes fechas de entregas por bloques:

Bloque A: 10 de mayo 2024

Bloque B: 14 de enero de 2025

Bloque C: 11 de noviembre de 2025

Se relaciona registro fotográfico del antes y después de las adecuaciones así:

Mejoramiento Bloque A:




Estado inicial de aulas



Adecuación aulas existentes bloque A



Estado inicial de aulas

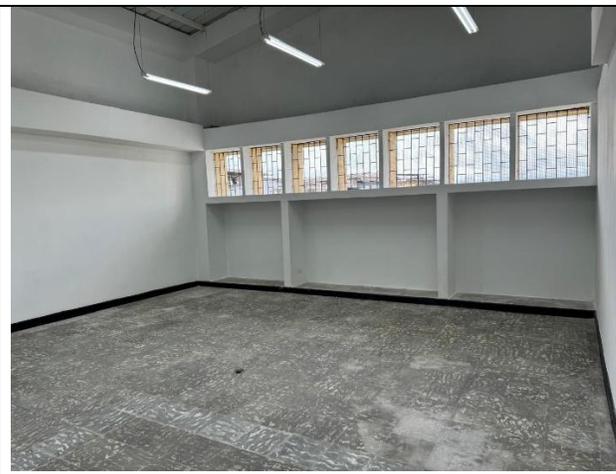

Adecuación aulas existentes bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A

Mejoramiento Bloque B:



Antes aula de clases bloque B



Adecuación de aula bloque B



Sala de profesores estado inicial



Sala de profesores estado actual



Antes bloque de aula




Adecuación de aula bloque B

Mejoramiento Bloques C



Circulaciones bloque C

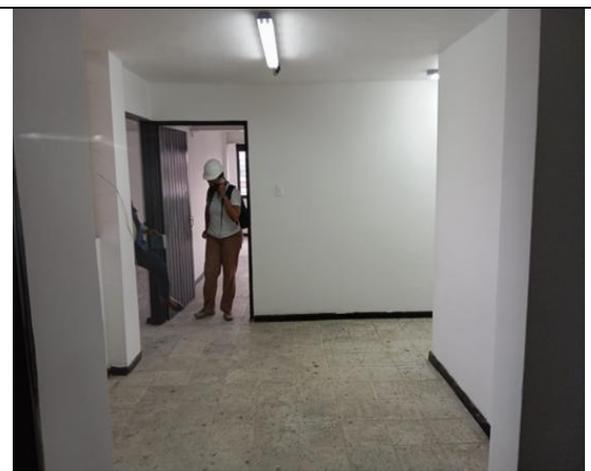

Mejoramiento circulaciones bloque C

| | |
|---|--|
|  |  |
| Aulas bloque c | Mejoramiento de aulas bloque c |

Obra de ampliación:

- ii) En la obra de ampliación fue ejecutada la cimentación, estructura en concreto de primer y segundo piso, placa de entepiso del bloque de aulas, así como las vigas aéreas del bloque de comedor, excavación para tanque de almacenamiento de agua, relleno y placa de la cancha; actualmente están ejecutando escaleras, rampa, tanque de almacenamiento de agua, mampostería en bloque de aulas y estructura metálica de cubierta del comedor.

En el último mes fue iniciada la ejecución de la mampostería y la rampa de acceso al bloque de aulas y el tanque de almacenamiento de agua.



Armado acero de refuerzo tanque de almacenamiento de agua potable



Ejecución mampostería en bloque de aulas



Fundido tanque de almacenamiento de agua

Mesas de trabajo desarrolladas con la Comunidad Educativa:

- 10 de abril 2023 – Socialización de inicio de actividades de inicio de obra.
- 07 de noviembre del 2023 - mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 15 de noviembre de 2023_ mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 10 de enero del 2024 – recorrido técnico acompañado por parte de la ETC de Buenaventura- contratista de obra – contratista de interventoría – FFIE.
- 02 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría
- 26 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría.
- 04 de marzo del 2024 - Cumplimiento Atención a sentencia 547 de 2023
- 02 de abril del 2024 - Presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 04 de abril del 2024 - Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 08 de abril del 2024 - Seguimiento a compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 04 de abril del 2024
- 10 de mayo de 2024 – Entrega del mejoramiento del Bloque A
- 03 de octubre de 2024 – Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento y obra nueva. De igual manera se hizo taller con los estudiantes “Reconociéndonos como líderes” cuyo objetivo es Fomentar el sentido de pertenencia por la institución educativa.
- 11 de noviembre de 2024 - Reunión Entrega del mejoramiento del Bloque C
- 14 de enero de 2025 – Reunión Entrega del mejoramiento del Bloque B
- 04 de febrero de 2025 – Taller para fortalecer sentido de pertenencia

Gestiones internas UG FFIE:

De otra parte, en cumplimiento del plan de mejora requerido en el marco de la Sentencia 547 de 2023, se han realizado mesas de trabajo internas con las direcciones de la UG FFIE.
