

**Informe Mensual IE Simón Bolívar Sede Principal**  
**Distrito Especial de Buenaventura**  
**30 de abril de 2025**

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 1256 de 2017, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Distrito Especial, Portuario, Económico, Turístico y Biodiverso de Buenaventura, el Ministerio, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), ejecuta el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en la Institución Educativa Simón Bolívar – Sede Principal.

El proyecto contempla la construcción de 12 nuevas aulas para educación básica y media, un comedor, una cocina, una zona recreativa, 21 baterías sanitarias, áreas de circulación y la intervención integral de mejoramiento en los tres bloques existentes del colegio, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

1. Cambio de estructura y teja de cubierta
2. Construcción y/o reparación de muros, repellos, estuco y pintura
3. Reparación de humedades y filtraciones
4. Limpieza de canales
5. Reparación y/o cambio de tuberías hidrosanitarias
6. Reconstrucción baterías sanitarias
7. Reconstrucción instalaciones eléctricas
8. Mantenimiento y pintura de fachada.

Estas actividades se ejecutan en el marco del Contrato de Obra No. 1380-1357-2020, a cargo del contratista Unión Temporal Corvez (tras la cesión del contratista Miroal S.A.S), y cuentan con la supervisión de la interventoría Consorcio Cinco Opciona. El contrato inició con la fase de estudios y diseños de la obra de ampliación, así como, la gestión de la licencia de construcción y los permisos requeridos. Posteriormente, se dio paso a la etapa de ejecución de obra, la cual comenzó el 13 de abril de 2023.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las condiciones del contrato desde su inicio a la fecha.

<b>Contrato de obra 1380-1357-2020.</b>	
Objeto	i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción para la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE PRINCIPAL.
Valor inicial del contrato	\$ 6.087.090.951
Fecha de suscripción contrato de obra	14 de enero de 2021
Plazo inicial del contrato	14 meses

<b>Contrato de obra 1380-1357-2020.</b>	
Fecha de inicio Fase 1	19 de febrero de 2021
Fecha de Socialización Fase 1	02 de octubre de 2017
Suspensión No .01	17 de junio de 2021 a 30 de julio de 2021. Coordinación de la socialización del diseño con la ETC Buenaventura, mesa del Paro Cívico y comunidad educativa
Suspensión No. 02	12 de agosto de 2021 a 11 de octubre de 2021. Solicitud de ajuste a la ETC del área de predio en documentos de titularidad.
Prórroga No 01 del plazo del contrato	75 días calendario, Plazo necesario para incorporar al diseño las solicitudes de la comunidad y mesa de paro
Suspensión No. 03	24 de diciembre de 2021 a 24 de enero de 2021. Se suspende por los plazos para realizar los trámites de licencia de construcción en la curaduría
Suspensión No. 04	08 de abril de 2022 a 06 de junio de 2022 Trámites y respuesta de la empresa de servicios públicos SAAB conexiones acueducto y alcantarillado
Suspensión No. 05	14 de junio de 2022 a 22 de septiembre de 2022 solicitud de aprobación diseños eléctrico por el operador Celsia
Suspensión No. 06	11 de octubre de 2022 a 09 de enero de 2023. Solicitud permiso intervención espacio público en Planeación para continuar trámite en Celsia
Fecha Inicio Fase 2 Obra	10 de abril 2023

<b>Contrato de obra 1380-1357-2020.</b>	
Prórroga No 01	6 meses 15 días. Plazo de acuerdo con cronograma de obra, ampliación a causa de afectación al proceso constructivo por situaciones encontradas en fase demolición, retiro de postes eléctricos, orden público, factores climáticos
Prórroga No 02	5 meses 19 días afectaciones por tubería oleoducto que restringe el avance obra entre 30 de junio de 2023 a 29 de noviembre de 2023.
Suspensión 7	26 de marzo de 2024 a 31 de marzo del 2024. – cancelación de suministro por parte de proveedores por festividades de semana Santa.
Suspensión 8	18 de noviembre de 2024 al 13 de enero de 2025. – orden público, protestas por falta de agua potable y desabastecimiento de materiales.
Suspensión 9	10 al 23 de febrero de 2025 por dificultades de orden de público.
Prórroga 03 y adición	Ampliación y adición de plazo por mayores cantidades de obra.
Prórroga 04	Prórroga del plazo de ejecución
Prórroga 05 y adición	Ampliación y adición de plazo por ajuste diseño hidrosanitario y rediseño de la cimentación del cerramiento perimetral.
Prórroga 06 y adición	Ampliación y adición de plazo por mayores cantidades de obra.
Suspensión 10	Del 01 al 21 de abril de 2025 por dificultades de orden público
Valor actual del contrato	\$11.819.193.312
Terminación contractual	24 de agosto de 2025

### Actividades y avance obra ampliación

El contrato cuenta con una ejecutado del 55.72 % que corresponde a la obra de mejoramiento integral que ya fue ejecutada y el avance de las actividades en la obra de ampliación:

- i) Del mejoramiento integral se informa que se tuvieron las siguientes fechas de entregas por bloques:
  - Bloque A: 10 de mayo 2024
  - Bloque B: 14 de enero de 2025
  - Bloque C: 11 de noviembre de 2025

Se relaciona registro fotográfico del antes y después de las adecuaciones así:

#### Mejoramiento Bloque A:




Estado inicial de aulas



Adecuación aulas existentes bloque A



Estado inicial de aulas

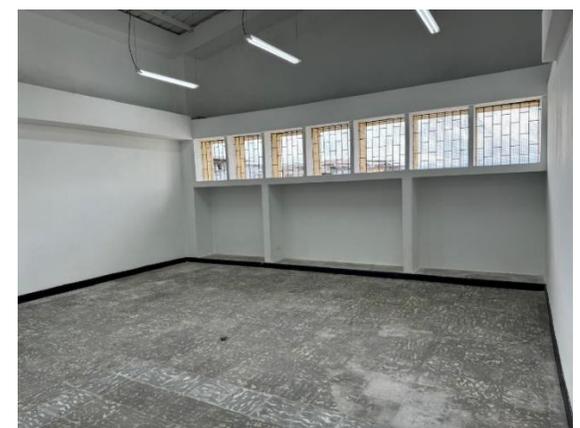

Adecuación aulas existentes bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A

### Mejoramiento Bloque B:



Antes aula de clases bloque B



Adecuación de aula bloque B



Sala de profesores estado inicial



Sala de profesores estado actual



Antes bloque de aula



Adecuación de aula bloque B


### Mejoramiento Bloques C



Circulaciones bloque C



Mejoramiento circulaciones bloque C

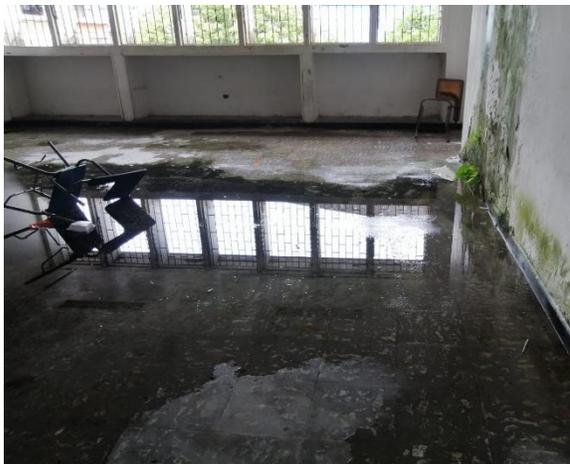

Aulas bloque c



Mejoramiento de aulas bloque c

### Obra de ampliación:

- ii) En la obra de ampliación fue ejecutada la cimentación, estructura en concreto de primer y segundo piso, placa de entrepiso del bloque de aulas, así como las vigas aéreas del bloque de comedor, excavación para tanque de almacenamiento de agua, relleno y placa de la cancha; actualmente están ejecutando la rampa, tanque de almacenamiento de agua, mampostería en bloque de comedor y finalización de estructura metálica de cubierta del comedor.  
En el último mes se dio continuidad a la ejecución de la mampostería y la rampa de acceso al bloque de aulas y el tanque de almacenamiento de agua. Al igual que se dio inicio a actividades de instalación de tubería



29 abr 2025 8:53:56 a.m.  
Grauting en mamposteria bloque de aulas piso1



25 abr 2025 8:09:51 a.m.  
Ejecución rampa bloque de aulas



29 abr 2025 9:42:20 a.m.  
5-23 Carrera 60a  
Buenaventura  
Valle del Cauca  
Continuidad a Fundición detanque de almacenamiento de agua

### Mesas de trabajo desarrolladas con la Comunidad Educativa:

- 10 de abril 2023 – Socialización de inicio de actividades de inicio de obra.
- 07 de noviembre del 2023 - mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 15 de noviembre de 2023\_ mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 10 de enero del 2024 – recorrido técnico acompañado por parte de la ETC de Buenaventura- contratista de obra – contratista de interventoría – FFIE.
- 02 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría
- 26 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría.
- 04 de marzo del 2024 - Cumplimiento Atención a sentencia 547 de 2023
- 02 de abril del 2024 - Presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 04 de abril del 2024 - Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 08 de abril del 2024 - Seguimiento a compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 04 de abril del 2024
- 10 de mayo de 2024 – Entrega del mejoramiento del Bloque A
- 03 de octubre de 2024 – Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento y obra nueva. De igual manera se hizo taller con los estudiantes “Reconociéndonos como líderes” cuyo objetivo es Fomentar el sentido de pertenencia por la institución educativa.
- 11 de noviembre de 2024 - Reunión Entrega del mejoramiento del Bloque C
- 14 de enero de 2025 – Reunión Entrega del mejoramiento del Bloque B
- 04 de febrero de 2025 – Taller para fortalecer sentido de pertenencia
- 23 de abril del 2025 – reunión de seguimiento a ejecución de contra y atención a observaciones técnicas por parte de la Institución educativa

### Gestiones internas UG FFIE:

De otra parte, en cumplimiento del plan de mejora requerido en el marco de la Sentencia 547 de 2023, se han realizado mesas de trabajo internas con las direcciones de la UG FFIE.

Bogotá, D.C., 23 de mayo de 2025



FFIE2025EE009246

Señores

**JUZGADO PRIMERO (01) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA**

RAMA JUDICIAL

j01pccmbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co

Buenaventura, Valle Del Cauca

Asunto: Cumplimiento Sentencia 547 de 2023

Cordial saludo;

En atención a lo ordenado por la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia número T-547 del 6 de diciembre de 2023, en el marco del proceso de revisión del fallo proferido el 11 de abril de 2023 por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, dentro del Expediente T-9.384.835, en lo que concierne a la IE - Simón Bolívar, sede Principal del distrito de Buenaventura, de conformidad a aquellos asuntos que atañen al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), en nombre de la Nación - Ministerio de Educación Nacional (MEN), me permito remitir el respectivo informe mensual, correspondiente al mes de Abril de 2025, el cual de conformidad a lo dispuesto en la referida sentencia se encuentra publicado en la página web del FFIE, al cual puede acceder a través del siguiente link [I.E. Simón Bolívar - Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa](#).

Del señor (a) Juez,

Atentamente,

**MAGDA YOLIMA AMAYA AREVALO**

Directora

DIRECCIÓN JURÍDICA

Proyectó: ADRIANA PATRICIA TORRES GARCIA

Revisó: JUAN CARLOS LAVERDE ALBA

Anexos: Informe Simón Bolívar Periodo abril 2025.pdf
